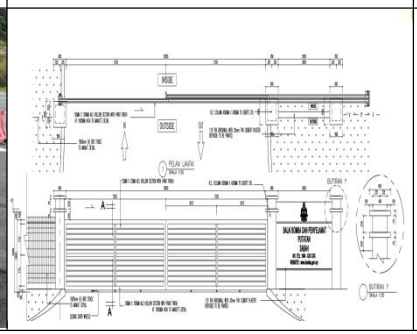
LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 10 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
8.	Binaan *built-in cabinet* telah mengikut lukisan pembinaan. Walaubagaimana pun, didapati bahagian tengah kaunter kawalan telah melendut. Pembaikan perlu dibuat untuk mengelakkan kerosakkan yang lebih serius. MINOR DEFECTS	Bilik Kawalan			06.05.2024	Selesai
9.	Penambahbaikkan perlu dilihat semula kerana pintu gelangsar tidak stabil dan bergoyang apabila ditarik disebabkan perincian rekabentuk yang tidak begitu praktikal bagi pintu pagar yang bersaiz besar dan panjang. MAJOR DEFECTS	Pintu Keluar Utama				Pihak kontraktor telah mengikut reka bentuk yang ditetapkan. 15.05.2024: Pihak BOMBA telah memberi ulasan di mana pagar tersebut berfungsi dengan baik semasa lawatan tapak pada haribulan tersebut.
