
PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN,SABAH

ID	Task Name	Baseline Duration	Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	Duration Variance
0	**ANALISA KELEWATAN" PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH." Rev 3**	**549 days**	**614 days**	**Mon 08 Feb '21**	**Wed 19 Apr '23**	**Mon 08 Feb '21**	**Wed 19 Jul '23**	**65 days**
1	**Site Possesion**	0 days	0 days	Mon 08 Feb '21	Mon 08 Feb '21	Mon 08 Feb '21	Mon 08 Feb '21	0 days
2	EOT	0 days	0 days	Tue 01 Mar '22	Tue 01 Mar '22	Tue 01 Mar '22	Tue 01 Mar '22	0 days
3	**Analisa Kelewatan**	**51 days**	**138 days**	**Fri 15 Jul '22**	**Mon 26 Sep '22**	**Fri 15 Jul '22**	**Mon 30 Jan '23**	**87 days**
4	Pekeliling 2.4 (Inisiatif Tambahan Kerajaan bagi Perlanjutan Masa 6	51 days	51 days	Fri 15 Jul '22	Mon 26 Sep '22	Fri 15 Jul '22	Mon 26 Sep '22	0 days
5	Kelulusan Wang Peruntukan Sementara (Loose Furniture &	0 days	0 days	NA	NA	Mon 30 Jan '23	Mon 30 Jan '23	0 days
6	Kelulusan Wang Peruntukan Sementara (Signage and room	0 days	0 days	NA	NA	Mon 30 Jan '23	Mon 30 Jan '23	0 days
7	Kelulusan Wang Peruntukan Sementara (Soft Landscapping)	0 days	0 days	NA	NA	Mon 30 Jan '23	Mon 30 Jan '23	0 days
8	**Report Preliminary**	**0 days**	**0 days**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**0 days**
11	**Initial Compliance**	**20 days**	**20 days**	**Mon 08 Feb '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Feb '21**	**Mon 08 Mar '21**	**0 days**
22	**Main Material On Site**	**0 days**	**0 days**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**0 days**
26	**Main Machinery Construction On-Site**	**0 days**	**0 days**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**Mon 08 Mar '21**	**0 days**
29	**Prelim Item**	**414 days**	**414 days**	**Mon 08 Feb '21**	**Fri 09 Sep '22**	**Mon 08 Feb '21**	**Fri 09 Sep '22**	**0 days**
50	**Site Preparation**	**18 days**	**18 days**	**Tue 09 Mar '21**	**Thu 01 Apr '21**	**Tue 09 Mar '21**	**Thu 01 Apr '21**	**0 days**
54	**Earthworks**	**45 days**	**45 days**	**Mon 05 Apr '21**	**Thu 10 Jun '21**	**Mon 05 Apr '21**	**Thu 10 Jun '21**	**0 days**
66	**Foundation Test**	**17 days**	**17 days**	**Tue 25 May '21**	**Fri 18 Jun '21**	**Tue 25 May '21**	**Fri 18 Jun '21**	**0 days**
68	**ESCP Works**	**11 days**	**11 days**	**Mon 21 Jun '21**	**Mon 05 Jul '21**	**Mon 21 Jun '21**	**Mon 05 Jul '21**	**0 days**
75	**Building Works**	**366 days**	**366 days**	**Thu 27 May '21**	**Tue 15 Nov '22**	**Thu 27 May '21**	**Tue 15 Nov '22**	**0 days**
1569	**External Works**	**347 days**	**347 days**	**Fri 19 Nov '21**	**Wed 05 Apr '23**	**Fri 19 Nov '21**	**Wed 05 Apr '23**	**0 days**
1869	**Mechanical & Electrical Works**	**225 days**	**225 days**	**Tue 18 Jan '22**	**Tue 13 Dec '22**	**Tue 18 Jan '22**	**Tue 13 Dec '22**	**0 days**
2203	**Testing & Commisioning M&E Works**	**178 days**	**178 days**	**Thu 31 Mar '22**	**Fri 16 Dec '22**	**Thu 31 Mar '22**	**Fri 16 Dec '22**	**0 days**
2244	**Provisional Sum**	**35 days**	**60 days**	**Mon 09 May '22**	**Thu 30 Jun '22**	**Mon 10 Apr '23**	**Fri 30 Jun '23**	**25 days**
2245	Loose Furniture & Curtains	14 days	31 days	Mon 09 May '22	Fri 27 May '22	Mon 10 Apr '23	Mon 22 May '23	17 days



PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN,SABAH

ID	Task Name	Baseline Duration	Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	Duration Variance
2246	Signage & Room Signage	14 days	14 days	Wed 01 Jun '22	Tue 21 Jun '22	Tue 23 May '23	Fri 09 Jun '23	0 days
2247	Soft Landscaping	7 days	15 days	Wed 22 Jun '22	Thu 30 Jun '22	Mon 12 Jun '23	Fri 30 Jun '23	8 days
2248	Bangunan Pencawang Elekterik & HDD Works SESB	7 days	7 days	Wed 22 Jun '22	Thu 30 Jun '22	Mon 12 Jun '23	Tue 20 Jun '23	0 days
2249	**Completion of Work**	**10 days**	**11 days**	**Thu 06 Apr '23**	**Wed 19 Apr '23**	**Wed 05 Jul '23**	**Wed 19 Jul '23**	**1 day**
2250	Cleaning Works	5 days	5 days	Thu 06 Apr '23	Wed 12 Apr '23	Wed 05 Jul '23	Tue 11 Jul '23	0 days
2251	As-Built Drawing Final Submission	5 days	5 days	Thu 13 Apr '23	Wed 19 Apr '23	Wed 12 Jul '23	Tue 18 Jul '23	0 days
2252	Joint Inspection	2 days	2 days	Tue 18 Apr '23	Wed 19 Apr '23	Tue 18 Jul '23	Wed 19 Jul '23	0 days
2253	**Handover**	0 days	0 days	Wed 19 Apr '23	Wed 19 Apr '23	Wed 19 Jul '23	Wed 19 Jul '23	0 days

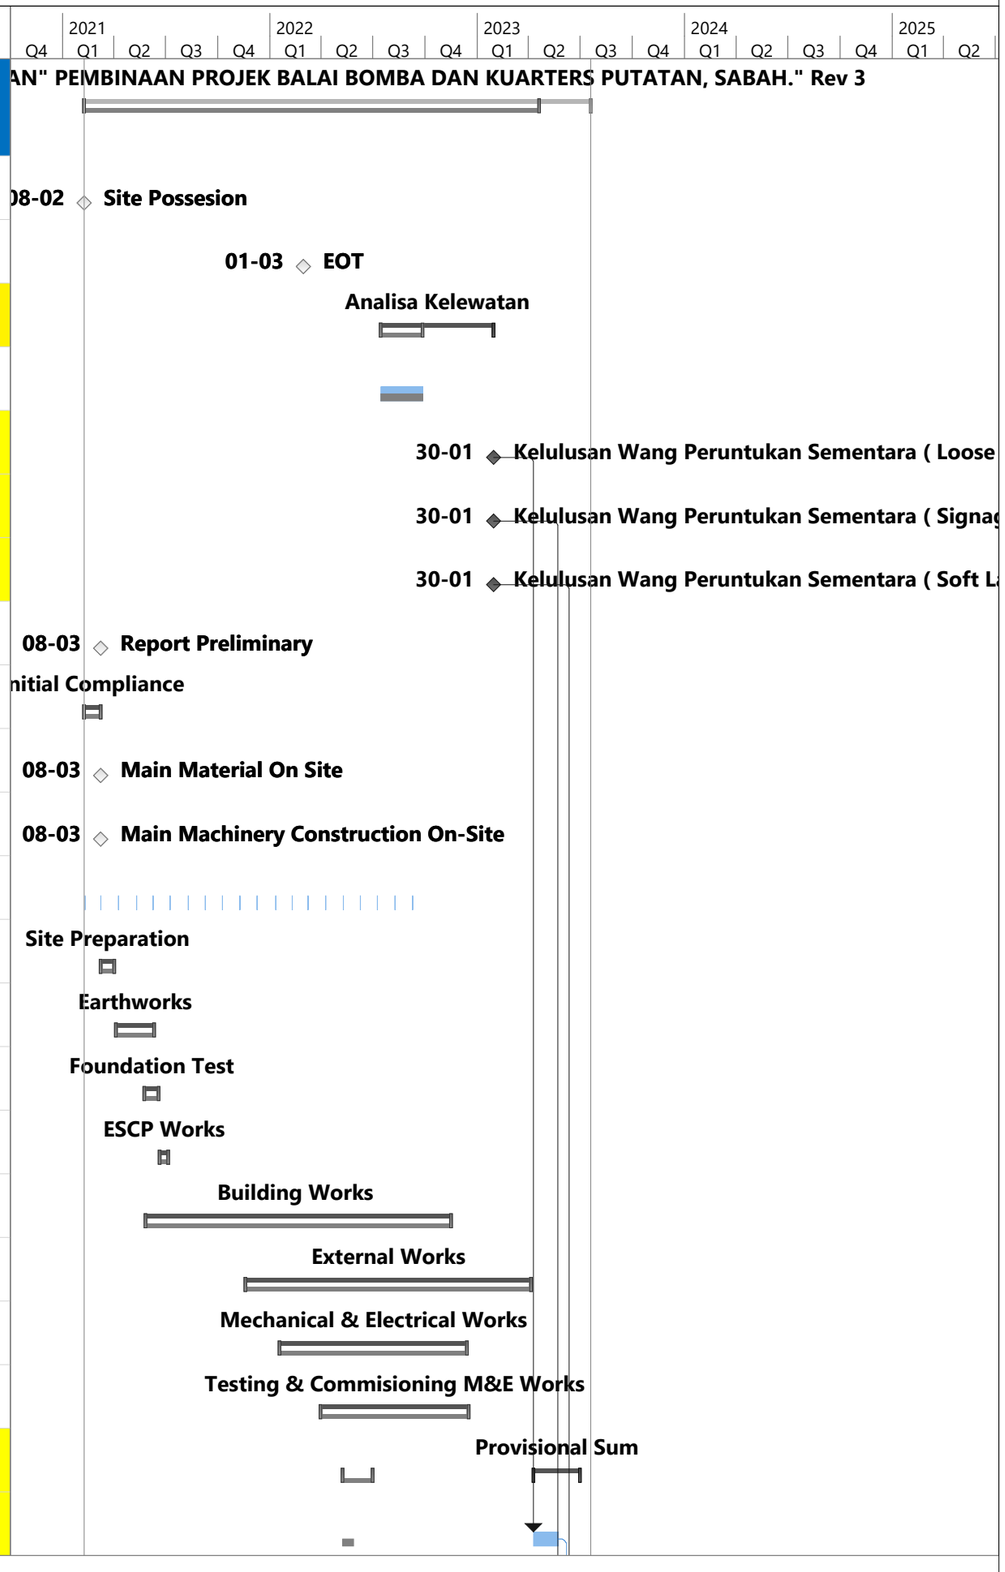
