	BK-PEMB-PK(P)-08-08	Pindaan	00
	BORANG NCR	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG NCR

No. Rujukan : NIA1902/BBPB/NCR(04) Tarikh : 8 September 2021

Nama Projek : Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah

Kepada (Kontraktor) : REMT UTAMA SDN BHD

BAHAGIAN A : KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Butiran Ketidakpatuhan :

(Sila guna lampiran borang pemeriksaan/laporan kecacatan/laporan kerosakan jika perlu)

Kerja ikatan bata tidak sempurna (disusun selari dan tidak bersilang – kesan kepada kekuatan ikatan mortar) di Bilik Penyelia grid D-E/3, Bilik Ketua Balai grid E-F/8, Ruang Pameran grid B-D/8 dan Bilik Utiliti grid E-F/4. Sila rujuk pada gambar kecacatan kerja yang disertakan.

Pelapor

P.P./Wakil P.P./PTB/Perunding (t.t, Nama, Cop) :

SYAHRIL MOHD ARIFFIN
INSPECTOR OF WORK
COWAM PPM 315
BEM W12782

BAHAGIAN B : ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh PP/PD/WPP/WPD/KUUB/KUR)

Sila ambil tindakan pembentulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas sebagaimana berikut :

- ☐ Dilupuskan dari binaan/tapak,
- ☐ Digunakan untuk tujuan/aplikasi lain, nyatakan .....
- ☑ Diperbaiki (*sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan CPP)*
- ☐ Diterima dengan kelulusan

Tindakan pembetulan hendaklah dilaksanakan segera mengikut arahan kontrak, spesifikasi dan penyata kehendak.

Tarikh keluar arahan 8 September 2021 Tarikh terima arahan _____

P.P/Wakil.P.P/
Perunding(t.t,Nama,Cop)

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Noor Izwan b. Rahim
ARKITEK
No Pendaftaran LAM : A/N 157

Wakil Kontraktor
(t.t,Nama,Cop) _____

BAHAGIAN C : TINDAKAN PEMBAIKAN/PENCEGAHAN (Untuk diisi oleh kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) .....

Wakil Kontraktor
(Tandatangan,Nama,Cop,Tarikh) .....

BAHAGIAN D : PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN


Tindakan pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi spesifikasi

Tarikh pemeriksaan : PP/PD/WPD/WPP/KUKUB/KUR (t.t, Nama, Cop) :

....



Gambar 1 : Bilik Penyelia grid D-E/3

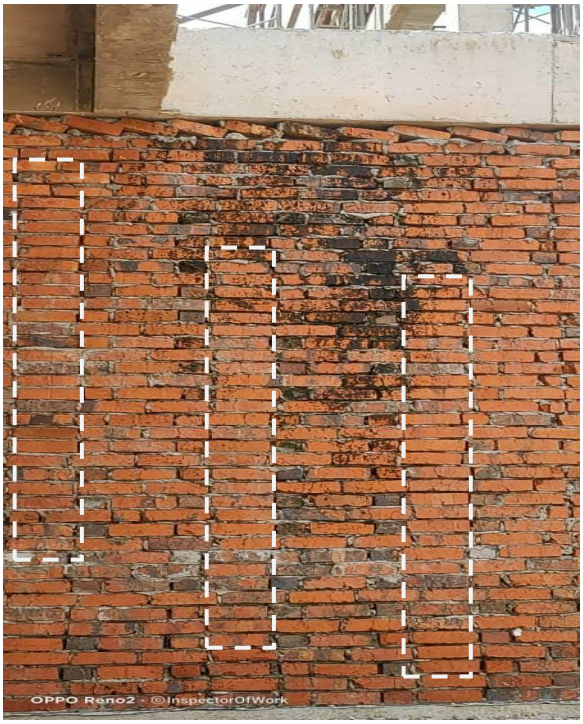

Gambar 2 : Bilik Ketua Balai grid E-F/8



Gambar 3 : Ruang Pameran grid B-D/8



Gambar 4 : Bilik Utiliti grid E-F/4
