KPKT

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH.

NO. KONTRAK : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019

LAPORAN KEMAJUAN BULANAN NO. 16

06 Mei 2021 – 12 Jun 2021

MAKLUMAT KONTRAK

1.	Tajuk Kontrak	:	Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah
2.	No. Kontrak	:	KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019
3.	Pemilik	:	Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
4.	Pegawai Penguasa / Pengarah Projek	:	Timbalan Setiausaha Bahagian (PP2)
5.	Wakil Pegawai Penguasa	:	Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Wilayah 6, Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.
6.	Kontraktor Utama	:	Remt Utama Sdn Bhd, Ground Floor, Lot 20, Grace Square, Jalan Pantai Sembulan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. Tel : 088-257 308, Faks : 088-260 869 remt.utama.sb@gmail.com
7.	Nilai Kontrak Asal	:	RM 6,305,978.26

MAKLUMAT KONTRAK

08.	Tempoh Kontrak	:	18 Bulan / 546 Hari
09.	Tarikh Milik Tapak	:	12 November 2019
10.	Tarikh Siap	:	10 Mei 2021
11.	Tarikh Siap Baru (EOT 1)	:	01 September 2021
12.	Tempoh Kontrak Baru	:	660 Hari
13.	Tempoh Tanggungan Kecacatan	:	12 Bulan
14.	LAD / Hari	:	RM1,147.69

SKOP KERJA


Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Daan Penyelamat Beaufort,
Sabah di atas Lot No. 175331227, Jalan Kompleks Sukan, Daerah Beaufort, 89800 Pekan Beaufort, Sabah Untuk Tetuan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia. Luas tapak cadangan pembinaan adalah 1.27 ekar daripada 2.995 ekar luas keseluruhan tapak.

1) Kerja-kerja infrastruktur tapak :-
a) Sistem saliran dan dari dalam tapak hingga ke parit monsun utama.
b) Sistem kumbahan.
b) Menaiktaraf Jalan utama dan jalan persimpangan.

Kerja binaan dan struktur bangunan baru :-
a) Bangunan Balai Bomba Utama beserta ruang tempat letak jentera.
b) Menara Latihan
c) Setor Logistik
d) Rumah Pam
e) Rumah Sampah
f) Pencawang Elektrik SESB
g) Tempat Letak Kenderaan Berbumbung
h) Padang Kawad
i) Pagar Perimeter dan pintu pagar utama
j) Kolah Air
k) Lanskap

2. Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal (M&E)
a) Kemudahan asas elektrikal dan mekanikal.
b) Pemasangan Roller Shutter.
c) Penyediaan kemudahan Genset.


PELAN TAPAK

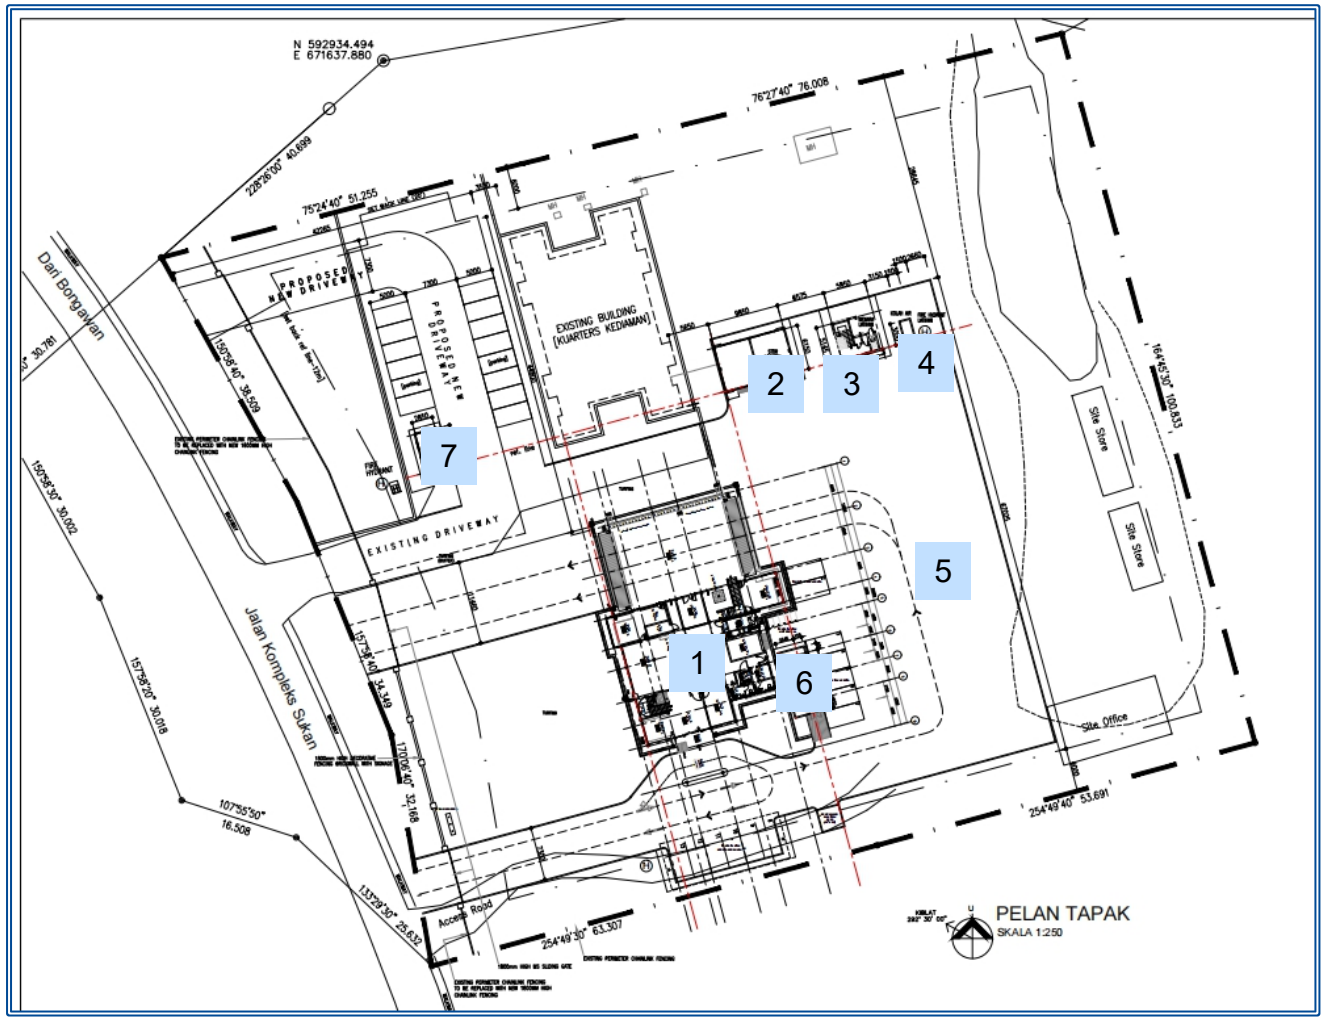




LEGEND :-
1- BLOK UTAMA BALAI BOMBA
2- LOGISTIK STOR
3- MENARA LATIHAN
4- KOLAH AIR
5- PADANG KAWAD
6- RUMAH PAM
7- RUMAH SAMPAH

CARTA ORGANISASI PROJEK

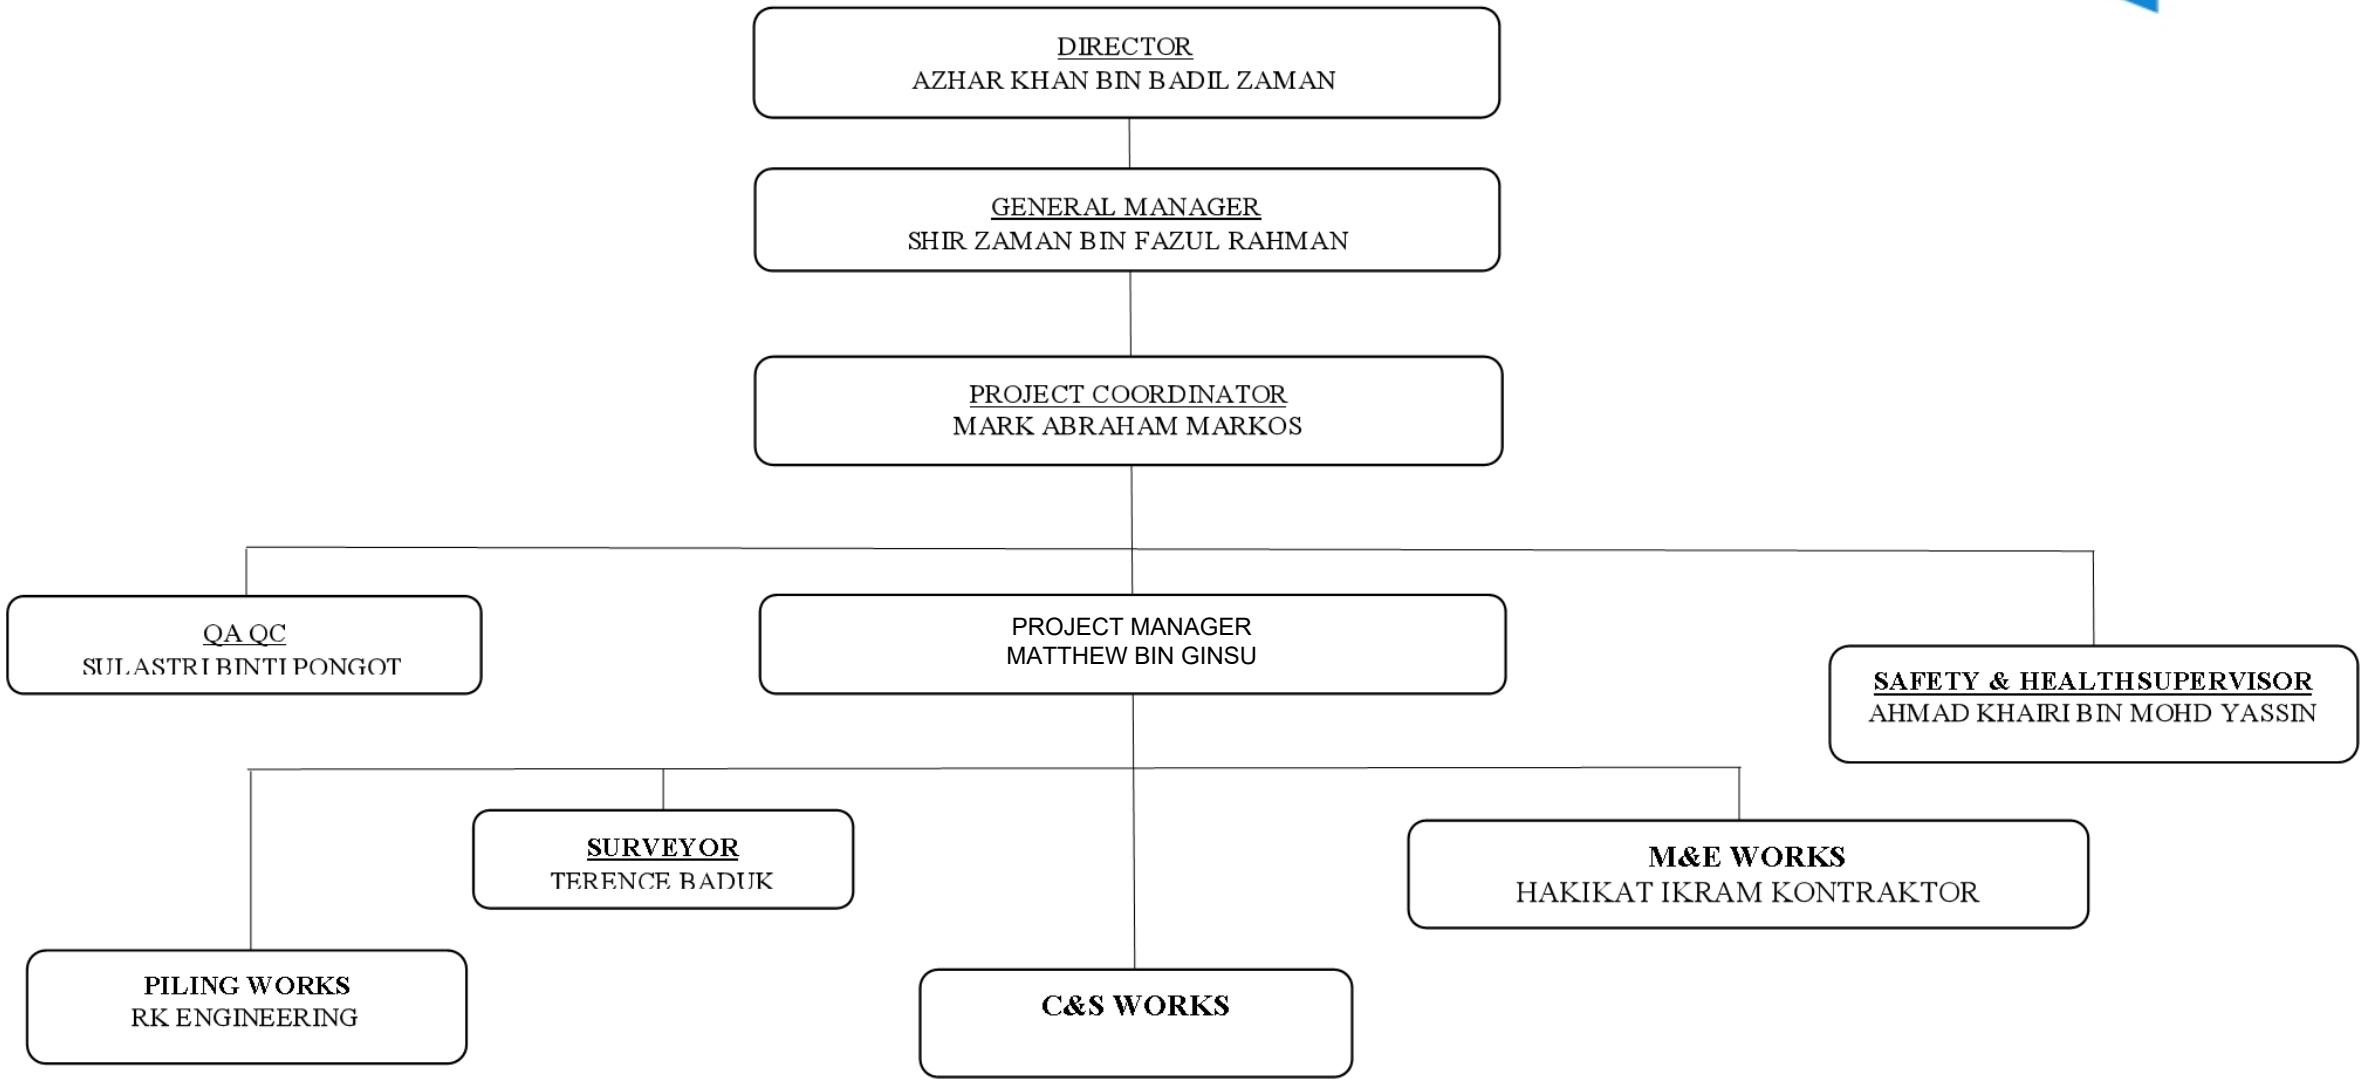

WORK PROGRAMME


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	Cost
1		**CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH**	**390 days**	**Tue 12-11-19**	**Wed 01-09-21**	**Tue 12-11-19**	**Wed 01-09-21**	**RM6,305,978.26**
2		PROJECT START	0 days	Tue 12-11-19	Tue 12-11-19	Tue 12-11-19	Tue 12-11-19	RM0.00
3		**PRELIMINARIES**	**308 days**	**Tue 12-11-19**	**Mon 10-05-21**	**Tue 12-11-19**	**Mon 10-05-21**	**RM303,180.00**
4		**Provisions In Condition of Contract PWD Form 203 (Rev.1/2010)**	**308 days**	**Tue 12-11-19**	**Mon 10-05-21**	**Tue 12-11-19**	**Mon 10-05-21**	**RM303,180.00**
317		**SITE PREPARATION, EARTHWORKS AND ASSOCIATED WORKS**	**309 days**	**Wed 11-12-19**	**Wed 09-06-21**	**Wed 11-12-19**	**Wed 09-06-21**	**RM1,817,866.00**
318		Site Clearing	25 days	Wed 11-12-19	Tue 14-01-20	Wed 11-12-19	Tue 14-01-20	RM35,812.00
319		Temporary Access Complete with Washbay	7 days	Wed 15-01-20	Thu 23-01-20	Wed 15-01-20	Thu 23-01-20	RM14,500.00
320		Earthwork: Cut and Fill to Formation Level	30 days	Fri 24-01-20	Thu 05-03-20	Fri 24-01-20	Thu 05-03-20	RM69,750.00
321		Temporary Earth Drain	14 days	Fri 06-03-20	Fri 17-07-20	Fri 06-03-20	Fri 17-07-20	RM19,475.00
322		**Geotechnical Work**	**57 days**	**Fri 06-03-20**	**Wed 16-09-20**	**Fri 06-03-20**	**Wed 16-09-20**	**RM318,461.00**
323		**PVD & Drainage Blanket**	**26 days**	**Fri 06-03-20**	**Tue 04-08-20**	**Fri 06-03-20**	**Tue 04-08-20**	**RM171,061.00**
328		**Surcharging**	**31 days**	**Wed 05-08-20**	**Wed 16-09-20**	**Wed 05-08-20**	**Wed 16-09-20**	**RM147,400.00**
333		**Marching Field & Roadworks**	**190 days**	**Thu 17-09-20**	**Wed 09-06-21**	**Thu 17-09-20**	**Wed 09-06-21**	**RM617,514.00**
341		**Sistem Saliran Permukaan**	**160 days**	**Thu 17-09-20**	**Wed 28-04-21**	**Thu 17-09-20**	**Wed 28-04-21**	**RM330,280.00**
347		**Sistem Retikulasi Air**	**116 days**	**Thu 10-12-20**	**Thu 20-05-21**	**Thu 10-12-20**	**Thu 20-05-21**	**RM75,177.00**
353		**Sistem Saliran Kumbahan**	**137 days**	**Thu 17-09-20**	**Fri 26-03-21**	**Thu 17-09-20**	**Fri 26-03-21**	**RM50,760.00**
358		**Fencing, Decorative Fencing and Gates**	**107 days**	**Wed 06-01-21**	**Thu 03-06-21**	**Wed 06-01-21**	**Thu 03-06-21**	**RM286,137.00**
359		Construction of Sliding and Double Swing Gate including RC Colums	13 days	Wed 06-01-21	Fri 22-01-21	Wed 06-01-21	Fri 22-01-21	RM30,500.00
360		Boundary Fencing	60 days	Mon 25-01-21	Fri 16-04-21	Mon 25-01-21	Fri 16-04-21	RM158,406.00
361		**Flag Pole**	**14 days**	**Mon 19-04-21**	**Thu 06-05-21**	**Mon 19-04-21**	**Thu 06-05-21**	**RM18,600.00**
363		**Kolah Air**	**14 days**	**Fri 07-05-21**	**Wed 26-05-21**	**Fri 07-05-21**	**Wed 26-05-21**	**RM17,607.00**
365		**Turfing**	**40 days**	**Fri 09-04-21**	**Thu 03-06-21**	**Fri 09-04-21**	**Thu 03-06-21**	**RM61,024.00**
367		**PILING WORKS**	**113 days**	**Fri 20-12-19**	**Thu 17-09-20**	**Fri 20-12-19**	**Thu 17-09-20**	**RM141,905.91**
404		**BUILDING WORKS**	**307 days**	**Fri 06-03-20**	**Wed 01-09-21**	**Fri 06-03-20**	**Wed 01-09-21**	**RM2,045,721.35**
405		**BANGUNAN BALAI BOMBA**	**297 days**	**Fri 06-03-20**	**Wed 18-08-21**	**Fri 06-03-20**	**Wed 18-08-21**	**RM1,488,465.70**
406		**Structural Works**	**193 days**	**Fri 06-03-20**	**Thu 25-03-21**	**Fri 06-03-20**	**Thu 25-03-21**	**RM718,874.90**
463		**Installation of Roofing System**	**27 days**	**Thu 25-03-21**	**Fri 30-04-21**	**Thu 25-03-21**	**Fri 30-04-21**	**RM153,530.00**
467		**Architectural Works**	**105 days**	**Thu 25-03-21**	**Wed 18-08-21**	**Thu 25-03-21**	**Wed 18-08-21**	**RM616,060.80**
525		**MENARA LATIHAN**	**249 days**	**Fri 18-09-20**	**Wed 01-09-21**	**Fri 18-09-20**	**Wed 01-09-21**	**RM362,700.00**
526		**Structural Works**	**240 days**	**Fri 18-09-20**	**Thu 19-08-21**	**Fri 18-09-20**	**Thu 19-08-21**	**RM245,247.00**
627		Wall Climbing System	20 days	Thu 05-08-21	Wed 01-09-21	Thu 05-08-21	Wed 01-09-21	RM109,737.00
628		Roof Builder's Work: GI Pipes to Parapet Walls, MS Door & waterproofing Work	5 days	Thu 05-08-21	Wed 11-08-21	Thu 05-08-21	Wed 11-08-21	RM7,716.00
629		**RUMAH PAM**	**59 days**	**Mon 02-11-20**	**Thu 21-01-21**	**Mon 02-11-20**	**Thu 21-01-21**	**RM42,408.00**
630		**Structural Works**	**48 days**	**Mon 02-11-20**	**Wed 06-01-21**	**Mon 02-11-20**	**Wed 06-01-21**	**RM25,175.70**
676		**Installation of Roofing System**	**8 days**	**Thu 07-01-21**	**Mon 18-01-21**	**Thu 07-01-21**	**Mon 18-01-21**	**RM4,767.00**
680		**Architectural Works**	**13 days**	**Tue 05-01-21**	**Thu 21-01-21**	**Tue 05-01-21**	**Thu 21-01-21**	**RM12,465.30**
708		**TEMPAT LETAK KERETA BERBUMBUNG**	**29 days**	**Mon 01-03-21**	**Thu 08-04-21**	**Mon 01-03-21**	**Thu 08-04-21**	**RM26,598.00**
717		**STOR LOGISTIK**	**114 days**	**Tue 01-12-20**	**Fri 07-05-21**	**Tue 01-12-20**	**Fri 07-05-21**	**RM83,699.65**
718		**Structural Works**	**82 days**	**Tue 01-12-20**	**Wed 24-03-21**	**Tue 01-12-20**	**Wed 24-03-21**	**RM50,165.50**
762		**Installation of Roofing System**	**9 days**	**Thu 25-03-21**	**Tue 06-04-21**	**Thu 25-03-21**	**Tue 06-04-21**	**RM7,166.00**
766		**Architectural Works**	**38 days**	**Wed 17-03-21**	**Fri 07-05-21**	**Wed 17-03-21**	**Fri 07-05-21**	**RM26,368.15**

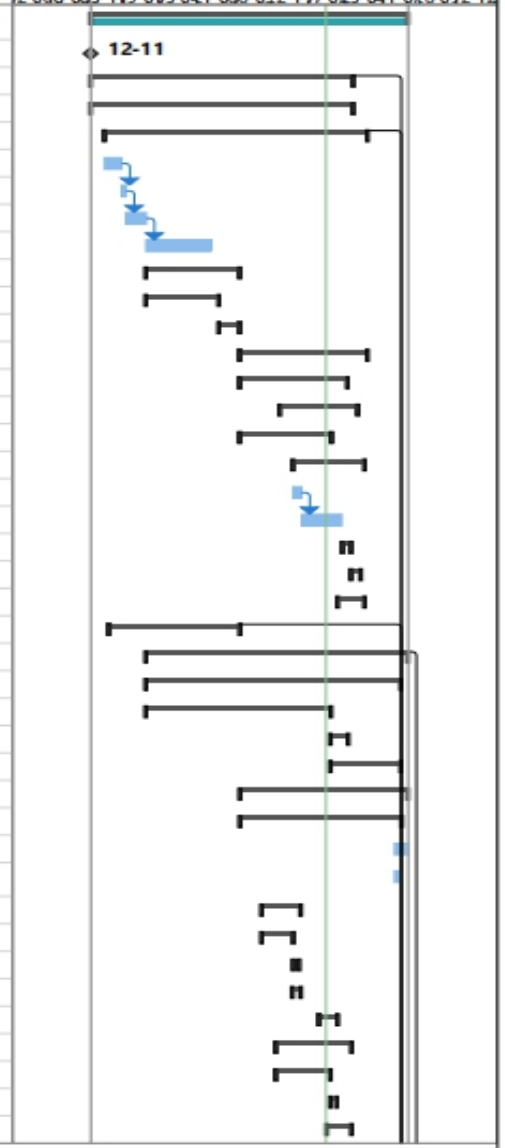

Project: Project1
Date: Mon 15-03-21

Task | Project Summary | Manual Task | Start-only | Deadline
Split | Inactive Task | Duration-only | Finish-only | Progress
Milestone | Inactive Milestone | Manual Summary Rollup | External Tasks | Manual Progress
Summary | Inactive Summary | Manual Summary | External Milestone

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	Cost
791		RUMAH SAMPAH	20 days	Thu 01-04-21	Wed 28-04-21	Thu 01-04-21	Wed 28-04-21	RM13,950.00
793		BANGUNAN PENCAWANG SESB	90 days	Wed 15-07-20	Tue 17-11-20	Wed 15-07-20	Tue 17-11-20	RM27,900.00
795		MECHANICAL WORKS	283 days	Fri 31-07-20	Tue 31-08-21	Fri 31-07-20	Tue 31-08-21	RM425,791.20
796		Internal Cold Water Plumbing	280 days	Fri 31-07-20	Thu 26-08-21	Fri 31-07-20	Thu 26-08-21	RM106,020.00
816		Internal Sanitary plumbing Services	154 days	Fri 18-12-20	Wed 21-07-21	Fri 18-12-20	Wed 21-07-21	RM67,518.00
836		Air Conditioning and Mechanical Services	149 days	Mon 01-02-21	Thu 26-08-21	Mon 01-02-21	Thu 26-08-21	RM76,390.20
855		Fire Protection Services	132 days	Mon 01-03-21	Tue 31-08-21	Mon 01-03-21	Tue 31-08-21	RM27,063.00
867		Motorized Roller Shutter	119 days	Mon 15-03-21	Thu 26-08-21	Mon 15-03-21	Thu 26-08-21	RM148,800.00
877		ELECTRICAL SERVICES	139 days	Thu 18-02-21	Tue 31-08-21	Thu 18-02-21	Tue 31-08-21	RM1,051,513.80
955		WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	65 days	Fri 01-01-21	Thu 01-04-21	Fri 01-01-21	Thu 01-04-21	RM520,000.00
961		PROJECT FINISH	0 days	Wed 01-09-21	Wed 01-09-21	Wed 01-09-21	Wed 01-09-21	RM0.00

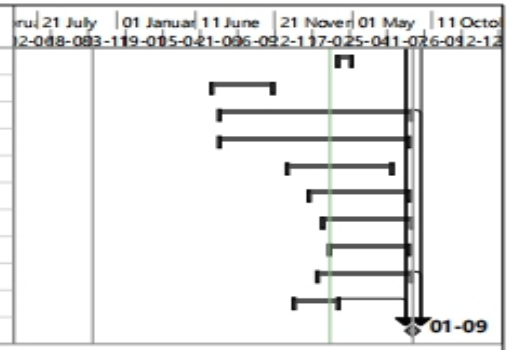

Project: Project1
Date: Mon 15-03-21

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

LEJER KONTRAK

REKOD TUNTUTAN BAYARAN KONTRAKTOR											REKOD TUNTUTAN BAYARAN KPKT								REKOD PEMBAYARAN		
No. Int	Tarikh Penilaian	Nilai Kerja dilaksanakan Dan Amaun Lain Kena Bayar			Bayaran Disyorkan	Jumlah Terkumpul	Bayaran Diperakukan (ditambah dengan GST)				No. Int	Tarikh Penilaian	Jumlah Diperakukan	Jumlah Terkumpul	WJP		Kontraktor Utama		**Tarikh Pembayaran**	Jumlah Pembayaran	Jumlah Tekumpul
							WJP		Kontraktor Utama												
		Nilai Keseluruhan Terkumpul (RM)	Nilai Kerja Pembinaan Terkumpul (RM)	% Nilai Kerja Pembinaan Terkumpul	(RM)	(RM)	Semasa (RM)	Terkumpul * (RM)	Semasa (RM)	Terkumpul * (RM)			(RM)	(RM)	Semasa (RM)	Terkumpul * (RM)	Semasa (RM)	Terkumpul * (RM)			
1	15-12-2019	26,300.00	26,300.00	0.42	26,300.00	26,300.00	2,630.00	2,630.00	23,670.00	23,670.00	1	28-01-2020	80,300.00	80,300.00	8,030.00	8,030.00	72,270.00	72,270.00	11-03-2020	72,270.00	72,270.00
2	18-01-2020	54,000.00	54,000.00	1.27	54,000.00	80,300.00	5,400.00	8,030.00	48,600.00	72,270.00	2	03-03-2020	65,700.00	146,000.00	6,570.00	14,600.00	59,130.00	131,400.00	10-06-2020	59,130.00	131,400.00
3	20-02-2020	65,700.00	65,700.00	2.32	65,700.00	146,000.00	6,570.00	14,600.00	59,130.00	131,400.00	3	02-06-2020	44,100.00	190,100.00	4,410.00	19,010.00	39,690.00	171,090.00	21-07-2020	39,690.00	171,090.00
4	18-05-2020	44,100.00	44,100.00	3.01	44,100.00	190,100.00	4,410.00	19,010.00	39,690.00	171,090.00	4	07-07-2020	62,600.00	252,700.00	6,260.00	25,270.00	56,340.00	227,430.00	14-09-2020	56,340.00	227,430.00
5	30-06-2020	62,600.00	62,600.00	4.01	62,600.00	252,700.00	6,260.00	25,270.00	56,340.00	227,430.00	5	21-07-2020	98,000.00	350,700.00	9,800.00	35,070.00	88,200.00	315,630.00	21-11-2020	88,200.00	315,630.00
6	21-07-2020	98,000.00	98,000.00	5.56	98,000.00	350,700.00	9,800.00	35,070.00	88,200.00	315,630.00	6	07-09-2020	131,000.00	481,700.00	13,100.00	48,170.00	117,900.00	433,530.00	25-11-2020	117,900.00	433,530.00
7	24-08-2020	131,000.00	131,000.00	7.64	131,000.00	481,700.00	13,100.00	48,170.00	117,900.00	433,530.00	7	03-11-2020	24,000.00	505,700.00	2,400.00	50,570.00	21,600.00	455,130.00	25-11-2020	21,600.00	455,130.00
8	30-09-2020	24,000.00	24,000.00	8.02	24,000.00	505,700.00	2,400.00	50,570.00	21,600.00	455,130.00	8	09-11-2020	24,700.00	530,400.00	2,470.00	53,040.00	22,230.00	477,360.00	25-11-2020	22,230.00	477,360.00
9	26-10-2020	24,700.00	24,700.00	8.41	24,700.00	530,400.00	2,470.00	53,040.00	22,230.00	477,360.00	9	08-01-2021	157,900.00	688,300.00	15,790.00	68,830.00	142,110.00	619,470.00	28-02-2021	142,110.00	619,470.00
10	30-11-2020	45,300.00	45,300.00	9.13	45,300.00	575,700.00	4,530.00	57,570.00	40,770.00	518,130.00	10	25-02-2021	79,000.00	767,300.00	7,900.00	76,730.00	71,100.00	690,570.00	28-04-2021	71,100.00	690,570.00
11	31-12-2020	112,600.00	112,600.00	10.92	112,600.00	688,300.00	11,260.00	68,830.00	101,340.00	619,470.00	11	28-02-2021	14,000.00	781,300.00	1,400.00	78,130.00	12,600.00	703,170.00	28-05-2021	12,600.00	703,170.00
12	31-01-2021	79,000.00	79,000.00	12.17	79,000.00	767,300.00	7,900.00	76,730.00	71,100.00	690,570.00											
13	28-02-2021	14,000.00	14,000.00	12.39	14,000.00	781,300.00	1,400.00	78,130.00	12,600.00	703,170.00											
14	31-03-2021	82,900.00	82,900.00	13.70	82,900.00	864,200.00	8,290.00	86,420.00	74,610.00	777,780.00											
15	30-04-2021	46,600.00	46,600.00	14.44	46,600.00	910,800.00	4,660.00	91,080.00	41,940.00	819,720.00											
								Total =	**819,720.00**							Total =	**703,170.00**			Total =	**703,170.00**
								Interim baru issue =	**87,210.00**												

MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (*MANPOWER*)

MANPOWER	Mei 2021																													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Main Contractor																																
General Manager			1	1	1	1	1	1			1	1													1		1	1	1			12
Project Coordinator			1	1	1	1	1	1			1	1													1		1	1	1			12
Project Manager			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
Safety Supervisor			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
QaQc			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
Supervisor			1	1	1	1	1	1		2	1	3													2		1	1	1			17
Surveyor										1	1	1																				3
Foreman			3	3	3	3	3	3		3	3	2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2			45
Security Guard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							2	2	2	2	2	2	2	2	50
General Workers			12	12	12	12	12	12		2	12	1				2									3	2	1	1	1			97
Brick Layer																									1							1
Concretor																																
Bar Bender			2	2	2	3	3	3		5	3	3				2									5	2	5	5	5			50
Carpenter			2	2	2	2	2	2		9	2	4				2									7	2	7	7	7			59
Plumber																																0
Subtotal	**2**		**27**	27	**27**	**28**	**28**	**28**		**27**	**29**	**21**					**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**28**		**23**	**23**	**23**			**353**
Consultant																																
COW (C&S)			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
COW (Architect)			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
COW (M&E)			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1		1	1	1			13
Total / Hari	**2**	**0**	**30**	**30**	**30**	**31**	**31**	**31**	**0**	**30**	**32**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**31**	**0**	**26**	**26**	**26**	**0**	**0**	**392**


SUNDAY PUBLIC HOLIDAY BANJIR

REKOD MESIN, JENTERA & PERALATAN

JENTERA / MESIN	MEI 2021																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Compactor																															
Excavator			1		1	1	1	1		1	1	1													1	1	1	1	1	1	1
Mobile Crane				1	1	1				1	1	1													1	1	1	1	1	1	1
Lorry 3 ton			1		1	1	1	1		1	1	1													1	1					
Concrete Mixer					1		1	1		1	1	1																	1	1	1
Concrete Pump																													1	1	1
Vibrator Poker			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1	1	2	2	2	2	2
Generator Set			1	1	1	1	1	1		1	1	1													1	1	2	2	2	2	2
Pile Rig Machine(PVD)			1		1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1
Jumlah / Hari	0	0	5	3	7	6	6	6	1	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	7	9	9	9

SUNDAY PUBLIC HOLIDAY BANJIR

REKOD CUACA APRIL 2021 VS MEI 2021

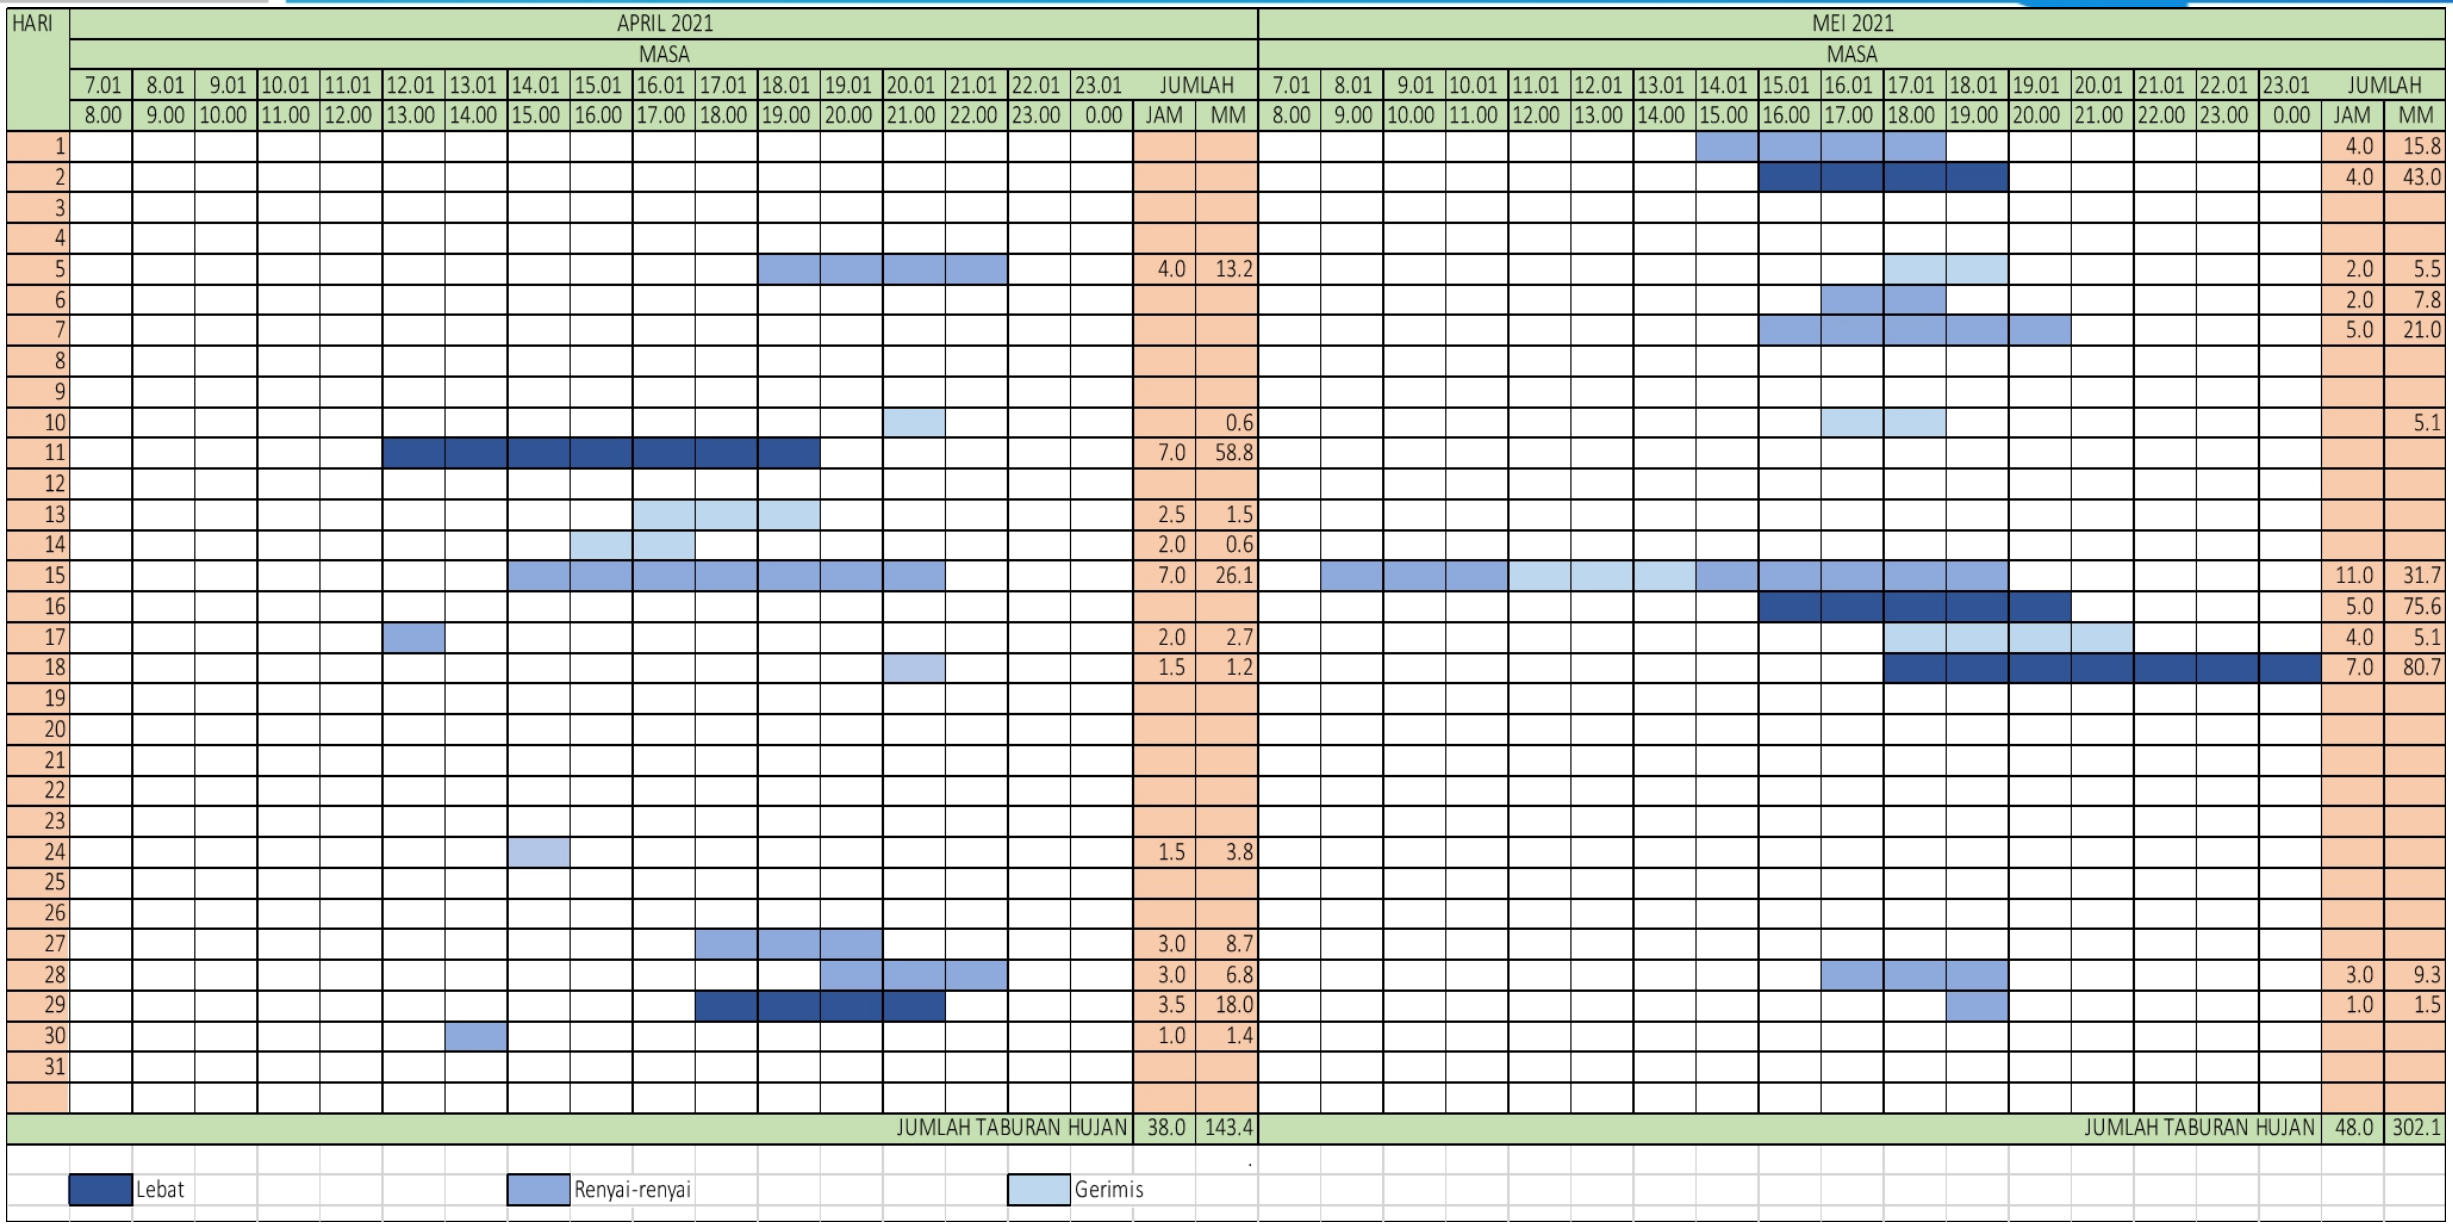

GAMBAR KEMAJUAN TAPAK

LAPORAN KEMAJUAN

BERGAMBAR

06 MEI 2021 - 12 JUN 2021

SEBELUM

SELEPAS









KERJA – KERJA PEMBINAAN RUMAH SAMPAH

SEBELUM



SELEPAS



KERJA – KERJA PEMBINAAN BLOK UTAMA

SEBELUM

SELEPAS





KERJA – KERJA GEOTEKNIKAL

SEBELUM

SELEPAS





KERJA – KERJA PEMBINAAN DI MENARA LATIHAN

SEBELUM

SELEPAS





KERJA – KERJA PEMBINAAN DI STOR LOGISTIK

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 06 MEI SEHINGGA 12 JUN 2021

BLOK UTAMA



29/05/2021



29/05/2021



29/05/2021

Persediaan untuk kerja-kerja konkrit di lower roof beam level 17.8mtr

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 08 APRIL SEHINGGA 04 MEI 2021

BLOK UTAMA



10/06/2021

12/06/2021





13/06/2021

Kerja-kerja mengikat bata sebagai mock up unit di Bilik Utiliti

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 06 MEI SEHINGGA 12 JUN 2021

BLOK UTAMA



11/06/2021

11/06/2021





12/06/2021

Kerja-kerja konkrit di aras 1 di *car porch roof area* sedang dijalankan

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 06 MEI SEHINGGA 12 JUN 2021

KERJA – KERJA RAWATAN TANAH



11/06/2021

12/06/2021





11/06/2021

Kerja-kerja penanaman PVD sedang dijalankan

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 08 APRIL SEHINGGA 04 MEI 2021

MENARA LATIHAN

10/05/2021



Kerja-kerja konkrit di tiang dan dinding RC di aras 1

29/05/2021



Kerja-kerja konkrit di lantai dan tangga aras 2

KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK 08 APRIL SEHINGGA 04 MEI 2021

STOR LOGISTIK

09/06/2021



10/05/2021



Kerja-kerja pemasangan *formwork* dan *rebar* tiang sedang dijalankan

GAMBAR SEMASA BANJIR
DI TAPAK
PADA
16 MEI 2021 - 24 MEI 2021


2021/05/16 21:28


2021/05/17 07:34


2021/05/17 07:31


2021/05/17 07:33


18 May 2021 09:37:02


2021/05/20 05:50


2021/05/20 05:52


20/05/2021, 12:14 PM












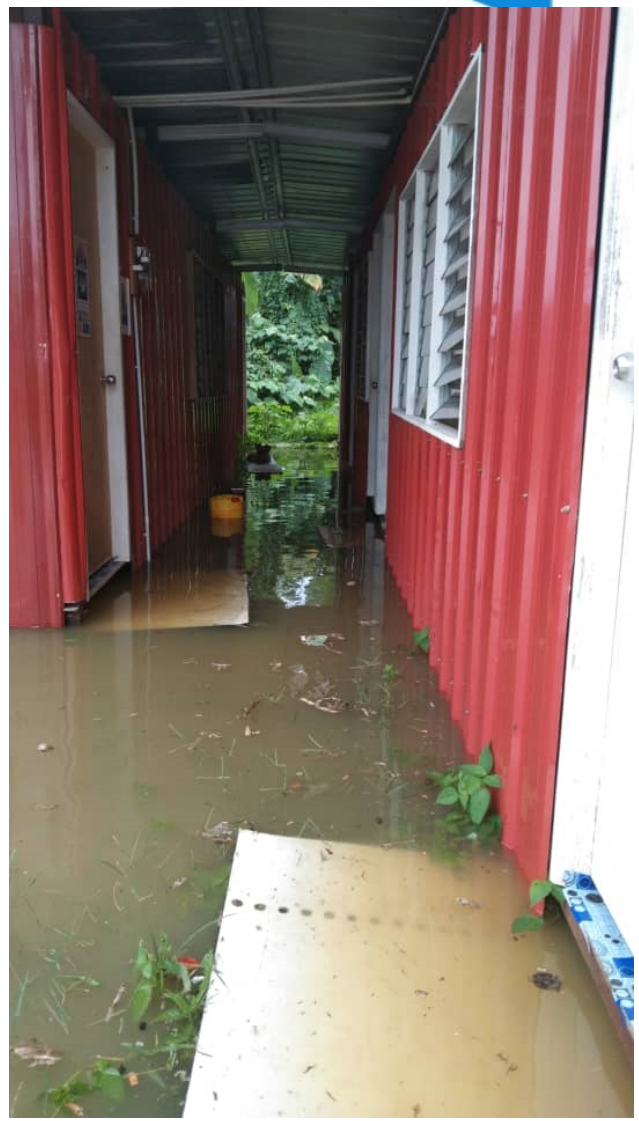







TAMAT
