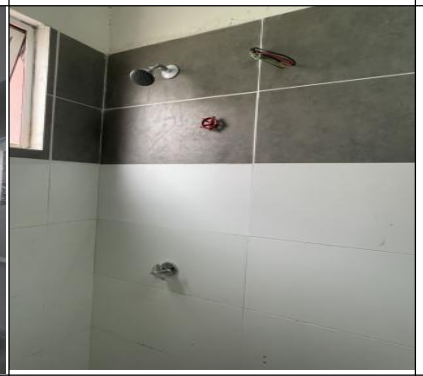
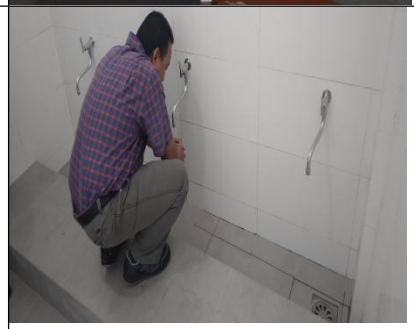
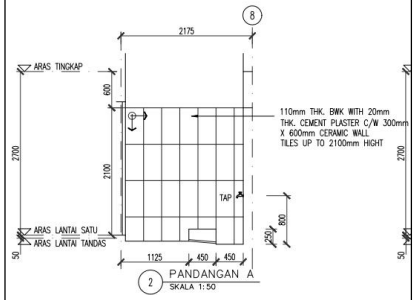
LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 10 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
7.	Tiada *shower rose* dipasang di dalam bilik air utama walaupun pembinaan telah mengikut lukisan pembinaan, namun ianya mengganggu kefungsian dan praktikaliti harian pengguna. MAJOR DEFECTS	Bilik Air Master Bedroom Kuarters			05.06.2024	Selesai.
8.	Pemasangan *goose neck tap* di tempat wudhuk menyebabkan pengguna perlu membongkok dengan sangat rendah, kurang praktikal dan membebankan pengguna. MINOR DEFECTS	Tempat Wudhuk				Pemasangan adalah mengikut lukisan pembinaan.
